


Fluxograma

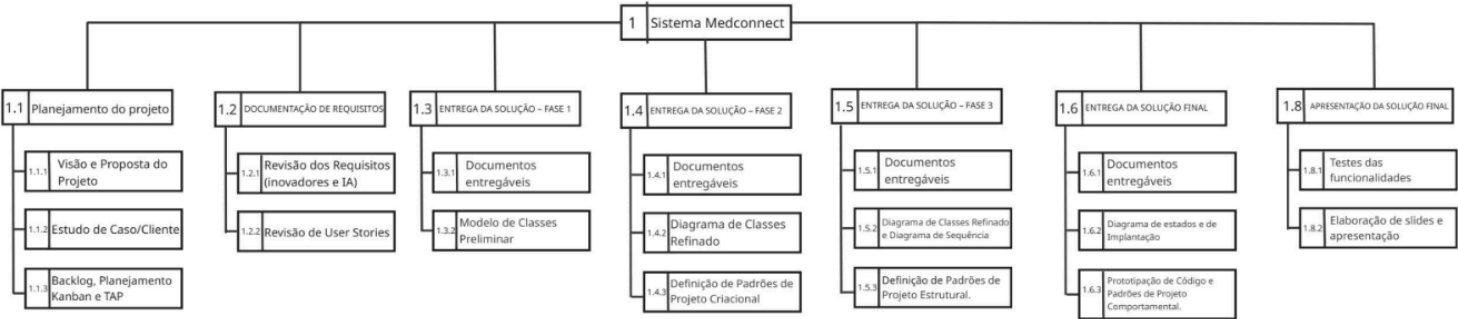

DICIONÁRIO EAP

Sistema MedConnect – Projeto Interdisciplinar IV

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.1	
Nome do Pacote de Trabalho: Planejamento do Projeto	
Descrição do Produto: Conjunto de artefatos de planejamento inicial que estabelecem a visão, o escopo preliminar e a organização do trabalho do Sistema MedConnect para a 2ª etapa de desenvolvimento/ segundo semestre de 2026.	
Critérios de Aceitação do Produto: Documento de Visão e Proposta aprovado pelo grupo; Estudo de Caso/Cliente validado com as informações do cliente; Backlog priorizado e quadro Kanban estruturado, de acordo também com o TAP (Termo de Abertura do Projeto).	
Descrição do Trabalho: • 1.1.1 Visão e Proposta do Projeto – elaboração do documento de visão, alinhando objetivo, escopo macro e proposta de valor da 2ª etapa (negociação parcial, histórico, IA, etc.). • 1.1.2 Estudo de Caso/Cliente – levantamento e análise da situação atual do cliente, dores e oportunidades que justificam o projeto. • 1.1.3 Backlog, Planejamento Kanban e TAP – criação do backlog inicial do produto, configuração do quadro Kanban da equipe e elaboração do Termo de Abertura do Projeto.	
Responsável: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst), com apoio de Maria Gabriela Bonatto (Scrum Master).	
Recursos necessários / alocados: Equipe completa (6 integrantes), quadro Kanban (GitHub), repositório (GitHub), documentação de requisitos da 1ª etapa.	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Atraso no cronograma acadêmico por indefinições de escopo; mitigação: validação antecipada da visão com o professor/cliente e reuniões semanais de alinhamento.	
Orçamento: R\$ 926,40 (≈15% do custo total do projeto, calculado por Pontos de Função – R\$6.176,00).	
Data para Início: 25/08/2026	
Data para Fim: 31/08/2026	
Duração: 5 dias úteis	
Dependência com outras atividades: Depende da entrega do marco "Tema do Trabalho Interdisciplinar e Requisitos" (24/08/2026). Precede a Documentação de Requisitos (1.2).	
Aquisições planejadas: Nenhuma aquisição externa; uso de ferramentas gratuitas (GitHub e Miro).	
Informações necessárias: Contexto e evolução do projeto, requisitos funcionais/não funcionais levantados na etapa anterior, partes interessadas e cronograma de marcos do PI.	

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.2	
Nome do Pacote de Trabalho: Documentação de Requisitos	
Descrição do Produto: Documentação consolidada e revisada dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, com destaque para os requisitos inovadores relacionados à IA.	
CrITÉrios de Aceitação do Produto: Lista de requisitos (RF, RNF, RN) revisada e sem inconsistências; User Stories revisadas, com critérios de aceitação claros e priorizadas no backlog.	
Descrição do Trabalho: • 1.2.1 Revisão dos Requisitos (inovadores e IA) – revisão e detalhamento dos requisitos relacionados às funcionalidades de IA (geração de descrição, recomendação e validação de planilhas). • 1.2.2 Revisão de User Stories – reescrita/ajuste das histórias de usuário do backlog, alinhando-as aos novos requisitos da 2ª etapa.	
Responsável: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst), com apoio de Felipe Leme do Prado (Engenheiro de IA e Dados).	
Recursos necessários / alocados: Backlog do produto, documento de requisitos da etapa anterior, ferramenta de gestão ágil (Projeto Kanban do GitHub).	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Requisitos de IA mal detalhados podem gerar retrabalho nas fases seguintes; mitigação: validação técnica com o Engenheiro de IA antes do fechamento.	
Orçamento: R\$ 617,60 (≈10% do custo total do projeto).	
Data para Início: 01/09/2026	
Data para Fim: 07/09/2026	
Duração: 5 dias úteis	
Dependência com outras atividades: Depende da conclusão do Planejamento do Projeto (1.1). Precede a Entrega da Solução – Fase 1 (1.3).	
Aquisições planejadas: Nenhuma.	
Informações necessárias: Requisitos funcionais RF01–RF18, requisitos não funcionais RNF01–RNF03 e regras de negócio RN01–RN06 descritos no documento do projeto.	

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.3	
Nome do Pacote de Trabalho: Entrega da Solução – Fase 1	
Descrição do Produto: Conjunto de documentos entregáveis da Fase 1 e evolução do modelo de classes preliminar, necessários para iniciar o desenvolvimento da solução.	
Critérios de Aceitação do Produto: Documentos entregáveis da Fase 1 aprovados pela equipe; Modelo de Classes preliminar consistente com os requisitos revisados.	
Descrição do Trabalho: • 1.3.1 Documentos entregáveis – consolidação da documentação de apoio exigida para a Fase 1 (ex.: matriz RACI, diagrama de casos de uso refinado, atas de reunião), conforme padrão do Projeto Interdisciplinar. • 1.3.2 Modelo de Classes Preliminar – elaboração do modelo de classes inicial do sistema, contemplando entidades como Empresa, Produto, Anúncio, Negociação e Proposta.	
Responsável: Andressa Fernanda Fernandes (Arquiteto de Software & DBA), com apoio de Maria Gabriela Bonatto (Scrum Master) na organização dos documentos entregáveis.	
Recursos necessários / alocados: Ferramenta de modelagem UML (Draw.io/StarUML), documentação de requisitos revisada (1.2), repositório GitHub.	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Modelagem incompleta pode gerar retrabalho na Fase 2; mitigação: revisão cruzada entre arquiteto e PO antes da entrega.	
Orçamento: R\$ 1.235,20 (≈20% do custo total do projeto).	
Data para Início: 08/09/2026	
Data para Fim: 14/09/2026	
Duração: 7 dias corridos	
Dependência com outras atividades: Depende da Documentação de Requisitos (1.2). Corresponde ao marco "Entrega 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar" (14/09/2026). Precede a Entrega da Solução – Fase 2 (1.4).	
Aquisições planejadas: Nenhuma.	
Informações necessárias: Requisitos funcionais priorizados e estrutura de dados necessária para os ALIs (Empresas, Produtos, Negociações, Propostas, Anúncios, Planos).	

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.4	
Nome do Pacote de Trabalho: Entrega da Solução – Fase 2	
Descrição do Produto: Consolidação dos documentos entregáveis da Fase 2 e evolução da modelagem de classes, incluindo a definição do primeiro padrão de projeto aplicado (criacional).	
Crítérios de Aceitação do Produto: Documentos entregáveis da Fase 2 aprovados (ex.: plano de tempo e custo); Diagrama de Classes refinado e validado com o arquiteto; Padrão de Projeto Criacional identificado e justificado tecnicamente.	
Descrição do Trabalho: • 1.4.1 Documentos entregáveis – consolidação da documentação de apoio da Fase 2 (ex.: plano de tempo/orçamento do projeto e cronograma macro, atas de reunião). • 1.4.2 Diagrama de Classes Refinado – evolução do modelo de classes preliminar com atributos, métodos e relacionamentos completos. • 1.4.3 Definição de Padrões de Projeto Criacional – escolha e justificativa de um padrão criacional (ex.: Factory Method/Builder) para a criação de anúncios e negociações.	
Responsável: Andressa Fernanda Fernandes (Arquiteto de Software & DBA), com apoio de Ana Carolina dos Santos Simões (PO) nos documentos entregáveis de tempo e custo.	
Recursos necessários / alocados: Ferramenta de modelagem UML, planilha de Pontos de Função, ferramenta de cronograma (Kanban do GitHub).	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Estimativas de custo desatualizadas em relação ao escopo real; mitigação: reavaliação dos Pontos de Função a cada fase.	
Orçamento: R\$ 1.235,20 (≈20% do custo total do projeto).	
Data para Início: 15/09/2026	
Data para Fim: 05/10/2026	
Duração: 21 dias corridos	
Dependência com outras atividades: Depende da Entrega da Solução – Fase 1 (1.3). Corresponde ao marco "Entrega 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar" (05/10/2026). Precede a Entrega da Solução – Fase 3 (1.5).	
Aquisições planejadas: Nenhuma.	
Informações necessárias: Resumo de Pontos de Função (193 PF, R\$6.176,00) e marcos do cronograma do PI-IV.	

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.5	
Nome do Pacote de Trabalho: Entrega da Solução – Fase 3	
Descrição do Produto: Consolidação dos documentos entregáveis da Fase 3 (RH, qualidade e comunicação) e evolução do modelo de classes com diagrama de sequência, além da definição do padrão de projeto estrutural.	
CrITÉrios de Aceitação do Produto: Documentos entregáveis da Fase 3 aprovados (ex.: plano de RH, qualidade e comunicação); Diagrama de Classes Refinado e Diagrama de Sequência representando corretamente os fluxos de negociação; Padrão de Projeto Estrutural definido e justificado.	
Descrição do Trabalho: • 1.5.1 Documentos entregáveis – consolidação da documentação de apoio da Fase 3 (ex.: plano de RH, qualidade e comunicação da equipe). • 1.5.2 Diagrama de Classes Refinado e Diagrama de Sequência – atualização do modelo de classes e criação do diagrama de sequência para os fluxos críticos (negociação, proposta, recomendação via IA). • 1.5.3 Definição de Padrões de Projeto Estrutural – escolha e justificativa de um padrão estrutural (ex.: Adapter/Facade) para integração com serviços externos (API Gemini, validação de CNPJ, tabelas SIMPRO/BrasÍndice).	
Responsável: Andressa Fernanda Fernandes (Arquiteto de Software & DBA) e Maria Gabriela Bonatto (QA / Scrum Master) para os documentos entregáveis de RH, qualidade e comunicação.	
Recursos necessários / alocados: Ferramenta de modelagem UML, matriz RACI (1.3.1), plano de comunicação da equipe.	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Falta de clareza nos papéis de RH/Comunicação pode gerar conflitos de equipe; mitigação: reuniões de retrospectiva quinzenais conduzidas pelo Scrum Master.	
Orçamento: R\$ 1.235,20 (≈20% do custo total do projeto).	
Data para Início: 06/10/2026	
Data para Fim: 26/10/2026	
Duração: 21 dias corridos	
Dependência com outras atividades: Depende da entrega da Solução – Fase 2 (1.4). Corresponde ao marco "Entrega 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar" (26/10/2026). Precede a Entrega da Solução Final (1.6).	
Aquisições planejadas: Nenhuma.	
Informações necessárias: Riscos do projeto (indisponibilidade da API Gemini, dados inconsistentes, baixa adesão, exposição de dados, atraso no módulo de negociação).	

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.6	
Nome do Pacote de Trabalho: Entrega da Solução Final	
Descrição do Produto: Consolidação da documentação entregável final, incluindo os diagramas de estados e de implantação da solução, além da prototipação de código aplicando um padrão de projeto comportamental.	
Crítérios de Aceitação do Produto: Documentos entregáveis finais aprovados; Diagrama de Estados representando corretamente o ciclo de vida das negociações; Diagrama de Implantação retratando a infraestrutura de hospedagem; protótipo de código funcional, aplicando corretamente o padrão de projeto comportamental escolhido.	
Descrição do Trabalho: • 1.6.1 Documentos entregáveis – consolidação da documentação final exigida para o encerramento das fases de modelagem do projeto. • 1.6.2 Diagrama de estados e de Implantação – elaboração do diagrama de estados para o ciclo de vida das negociações (RF12: aberta, aceita, recusada, encerrada) e do diagrama de implantação da infraestrutura de hospedagem web (RNF01). • 1.6.3 Prototipação de Código e Padrões de Projeto Comportamental – desenvolvimento de um protótipo de código para um dos módulos críticos do sistema, aplicando um padrão de projeto comportamental (ex.: Observer, para notificação de mudança de status da negociação, ou Strategy, para as regras de recomendação via IA).	
Responsável: Andressa Fernanda Fernandes (Arquiteto de Software & DBA) para os diagramas, e Beatriz Barros Rodrigues (Desenvolvedora Back-end/IA) para a prototipação de código.	
Recursos necessários / alocados: Ferramenta de modelagem UML, ambiente de desenvolvimento (IDE), repositório GitHub.	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Escolha inadequada do padrão comportamental pode dificultar a manutenção do código; mitigação: validação técnica do padrão escolhido com toda a equipe de desenvolvimento antes da implementação.	
Orçamento: R\$ 617,60 (≈10% do custo total do projeto).	
Data para Início: 27/10/2026	
Data para Fim: 23/11/2026	
Duração: 28 dias corridos	
Dependência com outras atividades: Depende da Entrega da Solução – Fase 3 (1.5). Precede a Apresentação da Solução Final (1.7).	
Aquisições planejadas: Nenhuma.	
Informações necessárias: Status possíveis das negociações (RF12), requisito de hospedagem web (RNF01) e catálogo de padrões de projeto comportamentais do GoF.	

FHO	
Nome do Projeto: Sistema MedConnect	
Dicionário de EAP	
Elaborado por: Equipe de desenvolvimento do Sistema MedConnect	Data: 31/08/2026
Aprovado por: Ana Carolina dos Santos Simões (PO / Business Analyst)	Versão: 1.0
Número da EAP: 1.7	
Nome do Pacote de Trabalho: Apresentação da Solução Final	
Descrição do Produto: Solução testada e apresentação final do projeto, demonstrando o funcionamento da plataforma MedConnect e os resultados alcançados frente aos objetivos do PI.	
CrITÉrios de Aceitação do Produto: Testes das funcionalidades executados sem falhas críticas; slides de apresentação e roteiro de demonstração aprovados pela equipe antes da entrega final.	
Descrição do Trabalho: • 1.7.1 Testes das funcionalidades – execução de testes funcionais e de regressão sobre os módulos entregues (cadastro, negociação, IA). • 1.7.2 Elaboração de slides e apresentação – preparação do material de apresentação e do Resumo Expandido do PI-IV para a banca/professor.	
Responsável: Participação de toda a equipe.	
Recursos necessários / alocados: Ambiente de homologação/produção, roteiro de testes, template de slides, GitHub Classroom para entrega final.	
Riscos Identificados e respostas planejadas: Atraso no cronograma acadêmico pode reduzir o tempo de testes; mitigação: iniciar os testes de forma incremental ao longo da Entrega da Solução Final (1.6), não apenas ao final.	
Orçamento: R\$ 308,80 (≈5% do custo total do projeto).	
Data para Início: 24/11/2026	
Data para Fim: 30/11/2026	
Duração: 7 dias corridos	
Dependência com outras atividades: Depende da Entrega da Solução Final (1.6). Corresponde aos marcos "Entrega Final do Projeto Interdisciplinar" e "Resumo Expandido PI-IV" (30/11/2026).	
Aquisições planejadas: Nenhuma.	
Informações necessárias: Marcos finais do PI, formato de entrega exigido (Classroom/GitHub) e critérios de avaliação da banca.	
